BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI

Số: /QHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08/10/2021

BẢN TIN TUẦN

DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG NĂM 2021

VÙNG NAM TRUNG BỘ

(Tuần từ 08/10 đến 14/10/2021)

Tuần qua toàn vùng có mưa diện rộng, riêng khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ trong vùng biến từ 150÷300 mm. Lượng nước trong các hồ chứa thủy lợi tiếp tục tăng, đạt từ 23÷75% dung tích thiết kế, cao hơn TBNN khoảng 6%.

Tình hình sản xuất vụ Hè Thu hiện đã thu hoạch xong. Tại các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận đang sản xuất vụ Mùa 2021 khoảng 96 nghìn ha (66 nghìn ha lúa, 29 nghìn ha hoa màu) với điều kiện nguồn nước đảm bảo sản xuất.

Dự báo tuần tới trong vùng tiếp tục có mưa diện rộng với lượng mưa phổ biến 100÷200 mm. Dự báo nguồn nước dài hạn cho thấy một số hồ chứa lớn có khả năng không tích đầy hồ khi kết thúc mùa mưa, cần có các giải pháp tích trữ nước và tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa mưa để đảm bảo sản xuất cho vụ Đông Xuân năm 2021-2022: Sông Trâu 60%; Sông Biêu 75% (Ninh Thuận).

Chi tiết xem trong file bản tin và phụ lục tính toán đi kèm.

I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC

1.1. Lượng mưa

a) Nhận xét tình hình mưa tuần qua

Tổng lượng mưa tuần qua trên địa bàn các tỉnh vùng Nam Trung Bộ từ 7÷359 mm/tuần, trong đó tại trạm Tam Kỳ 139 mm (Quảng Nam); Đức Phổ 359 mm, Quảng Ngãi 325 mm (Quảng Ngãi); Sông Pha 143 mm (Ninh Thuận). Tổng lượng mưa từ đầu năm 2021 đến nay so sánh với cùng kỳ TBNN cho thấy các tỉnh phổ biến ở mức cao hơn khoảng 4%. Nhiệt độ trung bình tuần qua tại các tỉnh phổ biến trong khoảng từ 27^0C÷$28,5^0$C, cao hơn so với TBNN từ $0,5^0$C÷2^0C. Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức từ 27^0C÷29^0C, cao hơn so với cùng kỳ TBNN từ $0,2^0$C÷2^0C.

b) Đánh giá tình hình mưa trong giai đoạn tiếp theo

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (bản tin ngày 13/09/2021) khu vực Nam Trung Bộ: Dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) có xu hướng giảm thêm và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina từ khoảng tháng 10/2021 và duy trì cường độ yếu cho đến hết năm 2021 với xác suất khoảng 70%, sang đến đầu năm 2022 nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần nhưng vẫn thấp hơn TBNN và trong trạng thái pha lạnh.

Nhiệt độ và không khí lạnh: Trong các tháng từ 10÷11/2021 nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng $0,5$÷$1,0^0$C; tháng 12/2021 nhiệt độ ở mức


thấp hơn 0,5÷1,0^{0}C. Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nhiệt độ trung bình mùa Đông năm 2021-2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2020-2021

Lượng mưa dự báo: Tháng 10÷12/2021, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn khoảng 20÷40% so với TBNN, từ tháng 01÷3/2022 tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 15÷25% so với TBNN cùng thời kỳ.

Bảng 1.1. Tổng hợp lượng mưa tuần, dự báo mưa tại các trạm chính

TT	Trạm	Tỉnh,TP	Tuần qua (mm)	Từ đầu năm 2021 (mm)	So sánh từ đầu năm với cùng kỳ (+/-%)					Dự báo kỳ tới (mm)
					TBNN	2020	2019	2016	2015	
1	Đà Nẵng	Đà Nẵng	81	1.101	7	37	18	-8	3	97
2	Ái Nghĩa	Quảng Nam	15	1.011	-10	23	3	-5	17	107
3	Câu Lâu		101	1.035	8	29	27	-5	28	108
4	Giao Thủy		126	1.203	7	55	20	26	21	88
5	Thành Mỹ		74	997	-27	-29	-14	-22	-40	200
6	Hiệp Đức		123	1.270	-15	12	23	-27	-40	107
7	Tam Kỳ		139	1.378	19	90	39	11	36	103
8	Hội Khách		75	1.041	-17	7	8	-12	-18	131
9	Trà My		191	1.804	-3	27	15	-18	-18	116
10	Nông Sơn		131	2.750	84	98	163	58	53	162
11	Hội An		76	1.016	3	30	31	6	37	108
12	Sơn Giang	Quảng Ngãi	195	1.554	3	-14	1	-6	38	75
13	Trà Khúc		328	1.564	53	78	51	112	192	77
14	Quảng Ngãi		325	1.668	55	75	53	97	276	74
15	Ba Tơ		203	1.391	-7	-14	-4	7	33	38
16	An Chỉ		237	1.378	29	11	-4	95	210	50
17	Đức Phổ		359	1.499	98	1	0		268	43
18	Mộ Đức		216	1.281	51	1	0	94	225	58
19	Trà Bồng		173	1.774	7	0	0		77	94
20	Quy Nhơn	Bình Định	99	647	-17	18	-28	7	32	57
21	An Hòa		101	1.022	-20	13	52	-29	-6	40
22	An Nhơn		55	520	-31	-2	-8	-17	-3	61
23	Định Bình		36	755	-17	-4	38	-22	-9	57
24	Sơn Hòa	Phú Yên	69	770	-12	28	87	-10	16	38
25	Phú Lâm		74	580	-26	28	3	-37	32	38
26	Tuy Hòa		70	575	-29	30	-5	-36	54	37
27	Củng Sơn		62	779	-7	48	92	-4	42	38
28	Ninh Hoà	Khánh Hòa	13	505	-26	-6	-25	-1	160	85
29	Đồng Trăng		10	908	10	25	-11	0	103	102
30	Nha Trang		36	650	12	134	45	50	184	110
31	Cam Ranh		28	712	22	92	10	31	111	129
32	Phan Rang	Ninh Thuận	7	308	-34	-25	-33	+7	+116	71
33	Sông Pha		143	1.853	+36	+46	+167	+22	+44	68
34	Tân Mỹ		42	655	-14	+4	-19	+12	+16	74
35	Phan Thiết	Bình Thuận	105	948	2	44	29	7	40	66
36	Hàm Tân		47	1.151	-19	-26	-34	-27	-2	115
37	Sông Lũy		63	747	-11	-6	34	4	17	53
38	Tà Pao		92	1.794	-13	18	-10	-9	20	139

TT	Trạm	Tỉnh,TP	Tuần qua (mm)	Từ đầu năm	So sánh từ đầu năm với cùng kỳ (+/-%)					Dự báo kỳ tới
					TBNN	2020	2019	2016	2015	
	Trung bình		**7÷359**	**308÷2750**	**4**	**26**	**21**	**10**	**62**	**37÷200**

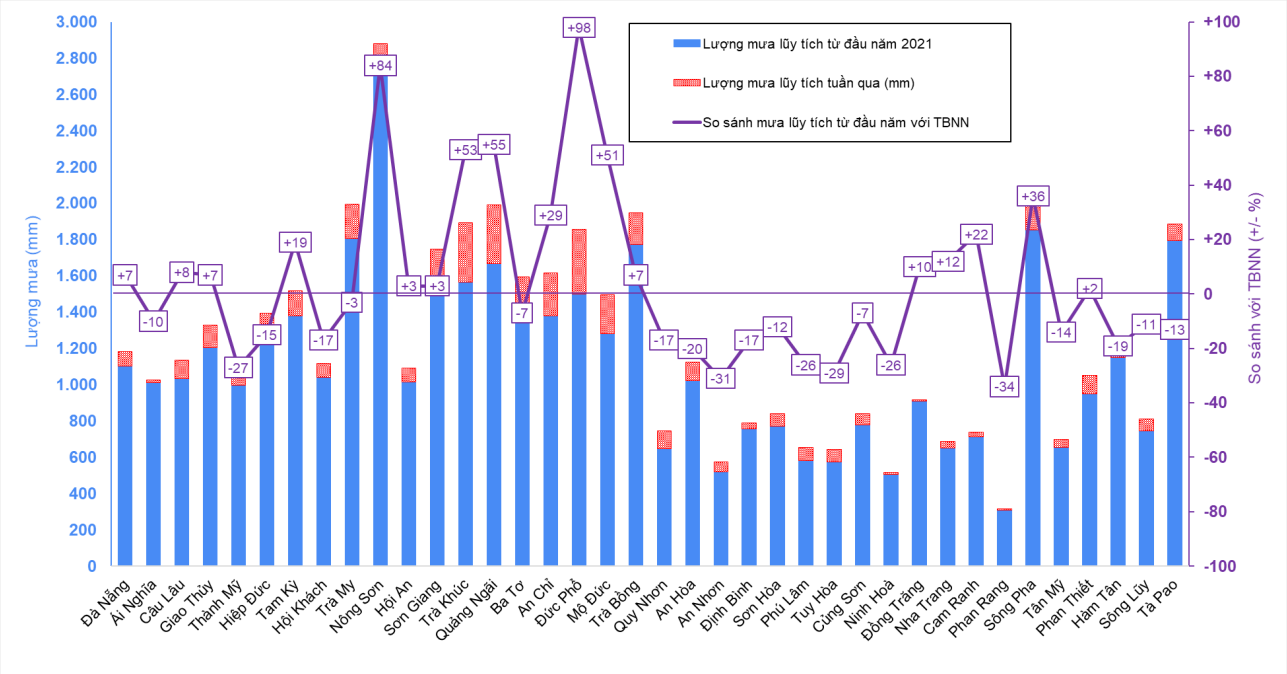

Hình 1. Lượng mưa lũy tích tại các trạm và so sánh với TBNN

2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi, thủy điện

a) Nguồn nước trữ các hồ chứa thủy lợi:

Dung tích trữ hồ chứa thủy lợi hiện đạt từ 23÷75% DTTK, **trung bình tăng khoảng 2% so với tuần trước**. Cụ thể từng lưu vực như sau:

1. Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: Tổng dung tích đạt 58% DTTK (tăng 4% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 33%, cao hơn năm 2019 là 26%, cao hơn năm 2016 là 2%, cao hơn năm 2015 là 21%.

2. Lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ: Tổng dung tích đạt 49% DTTK (giữ nguyên so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế cao hơn cùng kỳ TBNN là 20%, cao hơn năm 2020 là 17% và cao hơn năm 2019 là 28%.

3. Lưu vực sông Kôn-Hà Thanh và phụ cận: Tổng dung tích đạt 23% (tăng 2% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế cao hơn cùng kỳ TBNN là 6%, cao hơn năm 2020 là 8%, cao hơn năm 2019 là 12%.

4. Lưu vực sông Ba, Bàn Thạch và phụ cận: Tổng dung tích đạt 27% (tăng 5% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế, thấp hơn 6% so với TBNN, thấp hơn năm 2020 là 2%, thấp hơn so với năm 2019 là 2%.

5. Lưu vực sông Cái Ninh Hòa, Cái Nha Trang và phụ cận: Tổng dung tích đạt 49% (tăng 1% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế cao hơn 11% so với TBNN, cao hơn năm 2020 là 14%, cao hơn năm năm 2019 là 17%.


6. Lưu vực sông Cái Phan Rang và phụ cận: Tổng dung tích đạt 34% (tăng 1% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế thấp hơn 7% so với TBNN, cao hơn năm 2020 là 13%, thấp hơn so với năm 2019 là 26%.

7. Lưu vực sông Lũy, La Ngà và phụ cận: Tổng dung tích đạt 75% DTTK (giữ nguyên so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế tương đương cùng kỳ TBNN, cao hơn năm 2020 là 5%, cao hơn năm 2019 là 10%.

Chi tiết nguồn nước trong các hồ chứa xem phụ lục đi kèm, tổng hợp xem trong bảng 1.2 như sau:

Bảng 1.2. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi

TT	Lưu vực sông và phụ cận		Dung tích toàn bộ (triệu m3)		Tỷ lệ hiện tại (%)		Chênh lệch hiện tại so với cùng kỳ các năm (+/-)					Dự báo Wtb kỳ tới (+/-%)
			Thiết kế	Hiện tại	Wtb	Whi	TBNN	2020	2019	2016	2015	
Tổng/TB			**2.198**	**1.025**	**47**	**40**	**+6**	**+14**	**+11**	**-1**	**+11**	**+7**
1	Đà Nẵng	Vu Gia - Thu Bồn	28	14	51	48	+3	+25	+22	-25	-11	+22
2	Quảng Nam		498	289	58	49	+18	+33	+27	+3	+22	+8
3	Quảng Ngãi	Trà Khúc, sông Vệ	373	183	49	43	+20	+17	+28	+19	+20	+13
4	Bình Định	Kôn-Hà Thanh	515	119	23	18	+6	+8	+12	+2	+7	+5
5	Phú Yên	Ba - Bàn Thạch	69	19	27	15	-6	-2	-2	-11	0	+5
6	Khánh Hoà	Cái Ninh Hòa, Cái Nha Trang	211	103	49	44	+11	+14	+17	+7	+28	+3
7	Ninh Thuận	Cái Phan Rang	195	67	34	30	-7	+13	-26	-5	+13	+2
8	Bình Thuận	Lũy, La Ngà	309	230	75	71	0	+5	+10	+1	+8	+2

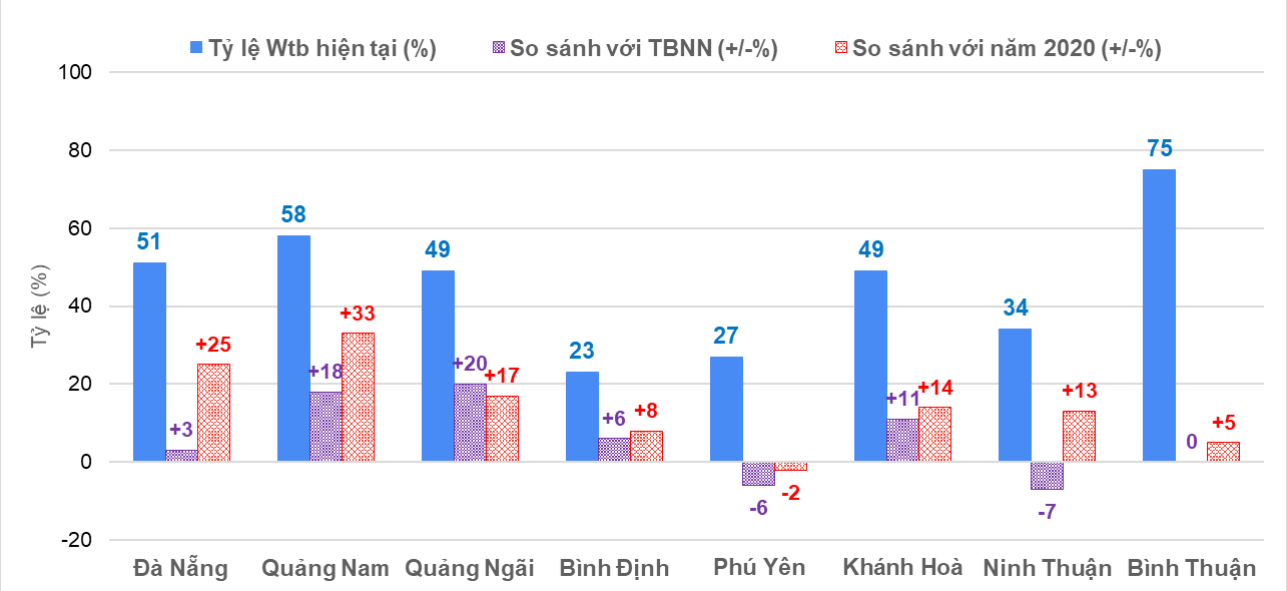

Hình 2. Tỷ lệ dung tích hiện tại và so sánh với cùng kỳ các năm

b) Nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước cho hạ du

Tuần qua, tổng dung tích các hồ trong toàn vùng **tăng khoảng 227 triệu m^3**, chi tiết dung tích hữu ích hiện tại của các hồ như sau:

- Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn: Các hồ A Vương, Đắk Mi 4A, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 (DTTK tổng cộng gần 1,2 tỷ m^3, bổ sung nước cho khoảng 11.000 ha đất canh tác của các tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng). Tuần qua tổng dung tích các hồ **tăng khoảng 110 triệu m^3**; Dung tích hữu ích các hồ đạt từ 28÷70% DTTK; so sánh với cùng kỳ TBNN, cao hơn 13÷47%.


- Lưu vực sông Ba: Các hồ An Khê, Kanak, Ba Hạ, Krông H'năng và sông Hinh (tổng DTTK 888 triệu m^3, bổ sung nước tưới cho khoảng 16.000 ha của tỉnh Phú Yên, riêng các hồ An Khê, Kanak bổ sung nước cho Bình Định). Tuần qua tổng dung tích các hồ **tăng khoảng 11 triệu m^3**, dung tích hữu ích các hồ đạt từ 11÷99% DTTK; So với cùng kỳ TBNN, hồ Sông Hinh ở mức thấp hơn 2%, các hồ còn lại cao hơn từ 19÷33%.

- Lưu vực sông Cái Phan Rang: Hồ chứa Đơn Dương (DTTK 155 triệu m^3, bổ sung nước tưới cho khoảng 16.000 ha của tỉnh Ninh Thuận). Tuần qua dung tích hồ **tăng khoảng 1 triệu m^3**, hiện tại dung tích trữ đạt 84% DTTK, cao hơn 23% so với cùng kỳ TBNN.

- Lưu vực sông Lũy - La Ngà: Các hồ Đại Ninh, Hàm Thuận (DTTK tổng cộng 775 triệu m^3, bổ sung nước cho 26.500 ha tỉnh Bình Thuận). Tuần qua tổng dung tích các hồ **tăng khoảng 95 triệu m^3**. Hiện tại, hồ Đại Ninh đạt 86% DTTK, hồ Hàm Thuận đạt 70% DTTK. So với cùng kỳ TBNN, hồ Đại Ninh cao hơn 24%, hồ Hàm Thuận thấp hơn 3%.

Bảng 1.3. Tổng hợp nguồn nước của hồ thủy điện bổ sung nước vùng hạ du

TT	Tên công trình	Dung tích toàn bộ (triệu m3)		Tỷ lệ hiện tại (%)		So sánh dung tích hiện tại với cùng kỳ (+/-%)					Q đến (m3/s)	Q chạy máy (m3/s)
		Thiết kế	Hiện tại	Wtb	Whi	TBNN	2020	2019	2016	2015		
	Tổng, TB	**4.792**	**3.048**	**64**	**49**	**+16**	**+23**	**+29**	**+18**	**+22**		
1	A Vương	344	231	67	58	+33	+39	+51	+32	+41	71	71
2	Sông Tranh 2	729	355	49	28	+13	+13	+24	+15	+4	324	171
3	Đăk Mi 4	312	248	80	60	+47	+32	+52	+49	+52	279	108
4	Sông Bung 4	511	440	86	70	+36	+52	+57	+19	+43	132	140
5	Đăk Đrinh	249	113	45	34	+6	+15	+31	+26	+3	222	37
6	Vĩnh Sơn A	34	24	69	53	+11	+24	+53	+34	+5	7	11
7	Vĩnh Sơn B	97	39	40	28	+9	+18	+29	+22	+20	8	0
8	Vĩnh Sơn C	58	30	51	19	+4	+10	+33	+19	+15	5	0
9	Trà Xom 1	40	10	26	6	-3	-11	+10			4	4
10	Kanak	314	151	48	43	+22	+39	+37	+15	+30	40	32
11	An Khê	16	16	99	99	+33	+28	+78	+17	+30	55	47
12	Ba Hạ	350	249	71	39	+24	+16	+31	+28	+34	442	400
13	Sông Hinh	357	70	20	11	-2	+4	+6	+1	+12	57	28
14	Krông Hnăng	166	102	61	41	+19	-5	+29			78	40
15	Ea Krông Rou	36	9	24	15	-4	+3	-6	-6		8	5
16	Đơn Dương	165	140	85	84	+23	+3	+72	+25	+20	41	37
17	Đại Ninh	320	283	89	86	+24	+23	+53	+22	+64	67	45
18	Hàm Thuận	695	538	77	70	-3	+32	-9	+15	+12	173	83

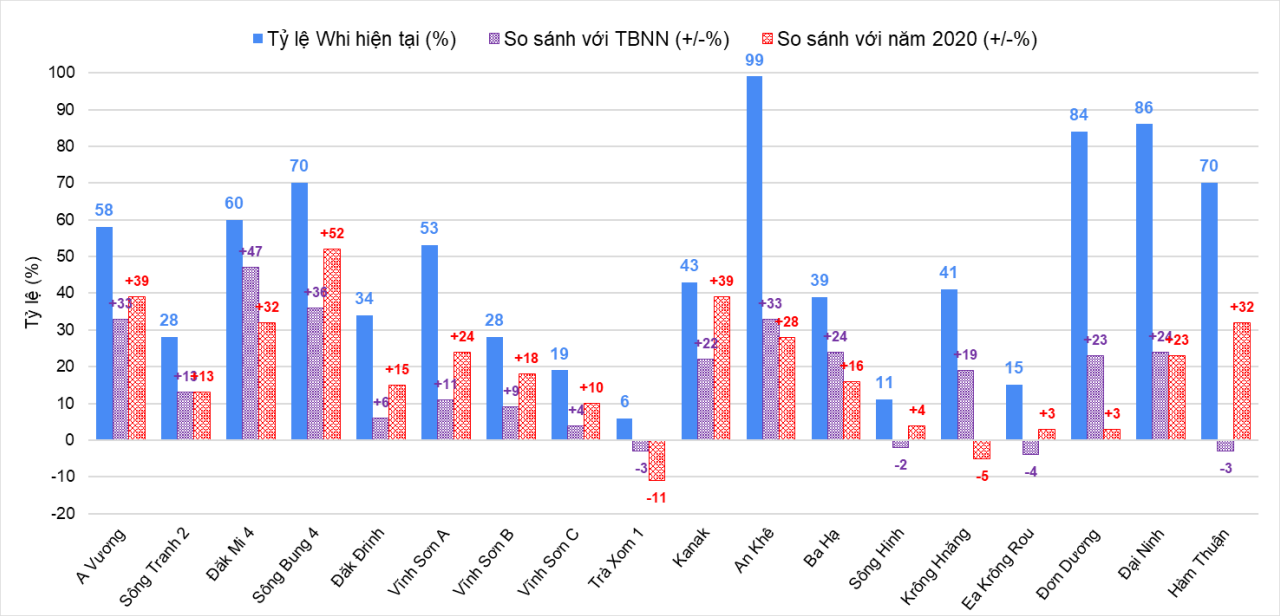

Hình 3. Tỷ lệ dung tích hữu ích các hồ thủy điện hiện tại và so sánh với cùng kỳ các năm

II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC VÀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HẠN HÁN

2.1. Khả năng cấp nước của công trình thủy lợi

Vụ Hè Thu 2021: Hiện tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ đã cơ bản thu hoạch xong.

Vụ Mùa 2021: Tại các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận va Bình Thuận đã bắt đầu sản xuất vụ Mùa 2021 với tổng diện tích gieo trồng là khoảng **96 nghìn ha lúa, hoa màu và cây hàng năm khác (66 nghìn ha lúa, 29 nghìn ha hoa, màu và cây hàng năm khác)**. Nhìn chung trong vụ Mùa 2021, các công trình thủy lợi trong vùng cơ bản đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tình trạng thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại các công trình vừa và nhỏ, cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất, ưu tiên tích nước cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. Cụ thể tại từng lưu vực như sau:

1. Lưu vực sông Kôn-Hà Thanh và phụ cận (tỉnh Bình Định): Vụ Mùa 2021 toàn tỉnh Bình Định gieo trồng khoảng 11.517 ha (lúa 7.633 ha, màu 3.884 ha). Trong 27 hệ thống công trình thủy lợi lớn chỉ 06 hệ thống sản xuất gồm: Hệ thống Định Bình - Văn Phong, hệ thống Tân An - Đập Đá, hồ Hội Sơn, Hòn Lập, Chánh Hùng và Phú Hà phục vụ sản xuất cấp nước vụ Mùa khoảng 2.840 ha. Còn lại các công trình không sản xuất vụ Mùa. Tổng nhu cầu nước còn lại cho sản xuất vụ Mùa khoảng 3,6 triệu m^3. Qua tính toán cân bằng nước cho thấy các công trình đáp ứng đủ 100% diện tích tưới theo kế hoạch. Tổng diện tích đảm bảo tưới 2.840/2.840 ha.

2. Lưu vực sông Cái Phan Rang và phụ cận (tỉnh Ninh Thuận): Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa 2021 của 24 công trình (21 hồ chứa, 3 hệ thống đập dâng) là khoảng 20.800 ha. Kết quả tính toán cân bằng nước cho toàn hệ thống cho thấy: 13/24 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích tưới theo kế hoạch. Có 8/21 hồ chỉ đáp ứng một phần và 3/21 công trình dự kiến dừng sản xuất, ưu tiên nguồn nước sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp, tích nước sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022.

Diện tích cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất là khoảng 3.253 ha tại các công trình Sông Trâu, Bà Râu, Tà Ranh, Bầu Zôn, Tân Giang, Sông Biêu, Bầu Ngứ, Suối Lớn, Ông Kinh, Phước Trung, Phước Nhơn.

3. Lưu vực sông Lũy, La Ngà và phụ cận (tỉnh Bình Thuận): Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa 2021 của các công trình thủy lợi sử dụng nước sau thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận - Đa Mi và 20 công trình hồ chứa vừa và lớn trong vùng là khoảng 44.734 ha (26.043 ha lúa, 585 ha màu và 18.106 ha Thanh Long). Kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy, 100% các công trình đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới.

Kết quả chi tiết các công trình xem phụ lục kèm theo, tổng hợp theo lưu vực sông và theo các tỉnh trong vùng xem trong bảng 2.1.

Bảng 2.1. Kết quả tính toán khả năng cấp nước các công trình

TT	Tỉnh	Lưu vực sông và phụ cận	Dung tích hiện tại		Diện tích sản xuất (ha)	Nhu cầu nước còn lại đến cuối vụ (triệu m3)	Kế hoạch sử dụng nước			Khuyến cáo đến cuối vụ
			Wtb (triệu m3)	Whi (triệu m3)			Khả năng đáp ứng (%)	Diện tích đáp ứng (ha)	Whi cuối vụ (%)	
	Tổng cộng		**416**	**330**	**71.671**	**288**	**95**	**68.417**	**83**	
1	Bình Định	Kôn-Hà Thanh	119	87	2.840	4	100	2.840	94	Đủ nước
2	Ninh Thuận	Cái Phan Rang	67	55	24.097	115	86	20.843	71	Thiếu cục bộ
3	Bình Thuận	Lũy, La Ngà	230	188	44.734	170	100	44.734	87	Đủ nước

2.3. Mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi

Lượng mưa cộng dồn trung bình tại các trạm chính trên địa bàn các tỉnh vùng Nam Trung Bộ tính từ tháng 1/2021 và mưa dự báo hết tuần sau: tại **các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN từ 20÷30%, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10÷15%.**

Hiện nay trong vùng đang trong giai đoạn mưa chính vụ vì vậy nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước ở mức thấp.

2.3. Tổng hợp thống kê chỉ tiêu ngành

TT	Tỉnh/TP	Diện tích kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2021 toàn tỉnh (ha)				Diện tích kế hoạch sản xuất tại các CTTL (ha)				Đã gieo trồng vụ Mùa 2021 (ha)	Diện tích khuyến cáo giãn SX (ha)
		Tổng	Màu, hàng năm khác	Cây ăn quả, CN	Lúa	Tổng	Màu, hàng năm khác	Cây ăn quả, CN	Lúa		
	Tổng	**135.086**	**29.464**	**39.389**	**66.233**	**78.236**	**9.745**	**22.723**	**48.069**	**60.311**	
1	Bình Định	11.517	3.884		7.633	3.113	79		3.034	6.961	
2	Ninh Thuận	27.100	10.000	2.100	15.000	26.100	9.000	2.100	15.000	9.400	3.254
3	Bình Thuận	96.469	15.580	37.289	43.600	49.023	666	20.623	30.035	43.950	

2.4. Đề xuất phương án tích nước hồ chứa cửa van

Trong vùng hiện có khoảng 82 hồ chứa có cửa van, trong đó có 32 hồ chứa lớn. Hiện có 10/32 hồ chứa có mực nước vượt tung độ đường phòng phá hoại cần xả tràn để giảm mực nước; 15/32 công trình đảm bảo mực nước quy định tại Quy trình vận hành và 7/32 công trình mực nước thấp hơn tung độ đường hạn chế cấp nước cần gia tăng tích trữ đưa mực nước hồ về mực nước giới hạn.

Cảnh báo có 04/32 công trình có nguy cơ chỉ tích đạt khoảng 60-90% dung tích vào cuối mùa lũ là các hồ Sông Trâu; Tân Giang; Sông Biêu; Lanh Ra thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Bảng 2.3. Hiện trạng mực nước các hồ và khuyến cáo phương án vận hành

TT	Tên công trình	Tỉnh, TP	Mực nước hồ hiện tại (m)	Tỷ lệ dung tích trữ hiện tại (%)	Qxả max tuần qua (m3/s)	Mực nước quy định vận hành hồ (m)			Dự báo tổng lượng dòng chảy về hồ đến hết mùa lũ (triệu m3)	Dự báo dung tích hồ đến cuối mùa lũ (%)	Khuyến cáo tích nước	
						MNDBT (m)	Tung độ đường phòng phá hoại	Tung độ đường hạn chế cấp nước			Khuyến cáo phương án vận hành	Mực nước hồ dự báo cuối mùa lũ (m)
1	Đồng Nghệ	Đà Nẵng	27,5	44,3		33,3	30,3	23,4	26,38	100	Giữ MN theo QTVH	33,3
2	Phú Ninh	Quảng Nam	25,8	57,2		32	29	24,8	364,23	100	Giữ MN theo QTVH	32
3	Việt An		83,82	48,1		92,1	85,8	77,3	28,83	100	Giữ MN theo QTVH	92,1
4	Vĩnh Trinh		24,69	59,2		30,15	26,8	18,9	30,6	100	Giữ MN theo QTVH	30,15
5	Liệt Sơn	Quảng Ngãi	26,98	16,31		39	32,64	24,59	31,3	100	Giữ MN theo QTVH	39
6	Núi Ngang		54,45	36,17		61	50,18	49,5	48,49	100	Xả tràn, giảm mực nước	61
7	Nước Trong		115,78	52,48		129,5	120	118,5	228,83	100	Tăng cường tích trữ nước	129,5
8	Núi Một	Bình Định	36,15	28,77		46,2	39,4	25,9	115,16	100	Giữ MN theo QTVH	46,2
9	Thuận Ninh		59,89	21,11		68	65	63	36,34	100	Tăng cường tích trữ nước	68
10	Hội Sơn		59,45	26,53		68,9	62	59,7	48,73	100	Tăng cường tích trữ nước	68,9
11	Định Bình		69,61	18,75		91,9	65	65	420,32	100	Xả tràn, giảm mực nước	91,9
12	Vạn Hội		30,9	8,48		44	32,5	31	23,63	100	Tăng cường tích trữ nước	44
13	Phú Xuân	Phú Yên	30,8	35	0	36,5	30,27	29,3	44,2	100	Xả tràn, giảm mực nước	36,5
14	Đồng Tròn		17,55	5	0	35,5	30,27	19,39	26,6	100	Tăng cường tích trữ nước	35,5
15	Suối Vực		79,88	23	0	88,1	88,1	87,21	17,5	100	Tăng cường tích trữ nước	88,1
16	Đá Bàn	Khánh Hoà	54,01	40,0		63	61,26	52,15	30,68	100	Giữ MN theo QTVH	63
17	Suối Dầu		37,4	55,0	0,85	42,5	39,6	37,9	19,9	100	Tăng cường tích trữ nước	42,5
18	Tà Rục		50,62	64,0	0,244	55,5	50,27	41,27	8,69	100	Xả tràn, giảm mực nước	55,5
19	Cam Ranh		27,18	50,0	0,176	32	30	27,05	11,23	100	Giữ MN theo QTVH	32
20	Hoa Sơn		16,75	41,0		26,5	25,1	13,2	12,06	100	Giữ MN theo QTVH	26,5

TT	Tên công trình	Tỉnh, TP	Mực nước hồ hiện tại (m)	Tỷ lệ dung tích trữ hiện tại	Qxả max tuần qua (m3/s)	Mực nước quy định vận hành hồ (m)			Dự báo tổng lượng dòng chảy về hồ đến hết mùa	Dự báo dung tích hồ đến cuối mùa lũ	Khuyến cáo tích nước	
						MNDBT (m)	Tung độ đường phòng phá hoại	Tung độ đường hạn chế cấp nước			Khuyến cáo phương án vận hành	Mực nước hồ dự báo cuối mùa lũ (m)
21	Sông Sắt	Ninh Thuận	166,8	33		174,5	169,5	163,1	31,1	100	Giữ MN theo QTVH	174,5
22	Trà Co		158,4	82		159	155,9	151,7	25,3	100	Xả tràn, giảm mực nước	159
23	**Sông Trâu**		**33**	**19**		**42,3**	**37,2**	**28,7**	**8,2**	**60**	**Vận hành linh hoạt**	**38,8**
24	Tân Giang		113,2	74		118,2	115,8	104,3	17,9	90	Giữ MN theo QTVH	116,8
25	**Sông Biêu**		**92,3**	**10**		**101,3**	**98**	**91**	**8,3**	**75**	**Vận hành linh hoạt**	**99,6**
26	Lanh Ra		33,2	22		42,47	39	31	10,5	90	Giữ MN theo QTVH	39,8
27	Sông Quao	Bình Thuận	87	83	67,4	89	87,17	75,11	85,96	100	Giữ MN theo QTVH	89
28	Sông Dinh 3		41,1	32	69	45,95	40	39,5	118,76	100	Xả tràn, giảm mực nước	45,95
29	Lòng Sông		74,68	84	83,4	76,95	68,67	55,1	91,5	100	Xả tràn, giảm mực nước	76,95
30	Sông Móng		75,35	107	40,7	75,8	73,59	70,16	51,46	100	Xả tràn, giảm mực nước	75,8
31	Cà Giây		74,35	94	14,4	74,7	70,29	67,79	76,89	100	Xả tràn, giảm mực nước	74,7
32	Phan Dũng		204,61	68	41,8	206,4	200,93	197,49	37,44	100	Xả tràn, giảm mực nước	206,4

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hiện tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ đã cơ bản thu hoạch xong vụ Hè Thu 2021, các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận va Bình Thuận đã bắt đầu sản xuất vụ Mùa 2021 với tổng diện tích gieo trồng là khoảng **96 nghìn ha lúa, hoa màu và cây hàng năm khác (66 nghìn ha lúa, 29 nghìn ha hoa, màu và cây hàng năm khác)**. Nhìn chung trong vụ Mùa 2021, các công trình thủy lợi trong vùng cơ bản đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.

Cảnh báo 04/32 công trình hồ chứa lớn có cửa van trong khu vực có nguy cơ chỉ tích đạt khoảng 60-90% dung tích vào cuối mùa lũ là các hồ Sông Trâu; Tân Giang; Sông Biêu; Lanh Ra thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Khuyến cáo hiện tại dựa trên số liệu hiện trạng nguồn nước và dự báo mưa đến hết tháng 12/2021, cần theo dõi các bản tin tiếp theo để cập nhật tình hình dự báo mưa và nguồn nước trong giai đoạn tới.

Bản tin tiếp theo sẽ phát hành vào ngày 15/10/2021.
